

Инвестор -

Заказчик Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул.5-й Армии, д.2/1

Подрядчик - ООО "КапиталСтрой", 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Новаторов, д.1

Стройка -Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г Усолье-Сибирское, ул.Богдана Хмельницкого, дом №12

|               |                   |
|---------------|-------------------|
|               | Код               |
| Форма по ОКУД | 322001            |
| по ОКПО       |                   |
| по ОКПО       |                   |
| по ОКПО       |                   |
| по ОКПО       |                   |
| по ОКПО       |                   |
| по ОКПО       |                   |
| по ОКПО       |                   |
| номер         | 15/ПО-А/2017-2018 |
| дата          | 5   03   2018     |
| Вид операции  |                   |

Договор подряда (контракт)

|       |                  |                 |            |
|-------|------------------|-----------------|------------|
| Номер | Дата составления | Отчетный период |            |
| 1     | 04.05.2018       | с               | по         |
|       |                  | 05.04.2018      | 04.05.2018 |

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |   |                               |
|-----------|---|-----|--|---|-------------------------------|
|           |   |     | с начала проведения работ                  | с начала года по отчетный месяц включительн | в том числе за отчетный месяц |
| 1         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                             |
|           | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:               |     | 1 067 342,76                               | 1 067 342,76                                | 1 067 342,76                  |
| 1         | Ремонт крыши  |     | 1 067 342,76                               | 1 067 342,76                                | 1 067 342,76                  |
|           |   |     |  | Итого, руб.                                 | 1 067 342,76                  |
|           |   |     |  | Налог на добавленную стоимость, руб.        | 192 121,70                    |
|           |   |     |  | Всего с учетом налогов, руб.                | 1 259 464,46                  |

Заказчик И.О. Генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

м.п.



Подрядчик Директор ООО "КапиталСтрой"

м.п.

Согласовано Главный бухгалтер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области



(подпись)

(подпись)

(подпись)

К.Г.Сорокиков

(расшифровка подписи)

В.В.Шестопапов

(расшифровка подписи)

О.Г. Боброва

(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

|  |                            |                   |
|--|----------------------------|-------------------|
| Инвестор -   | Форма по ОКУД              | Код               |
| Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области                                       | по ОКПО                    | 0322005           |
| Подрядчик - ООО "КапиталСтрой" (Субподрядчик-ООО "ВостоктяжстройУсолье")   |                            |                   |
| Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Богдана Хмельницкого, дом №12 | Вид деятельности по ОКДП   | 45.25.1           |
| Объект- ремонт крыши   | Договор подряда (контракт) | 15/ПО-А/2017-2018 |
|  | номер                      |                   |
|  | дата                       | 05.03.2018        |
|  | Вид операции               |                   |

|                 |                  |                 |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
| 1               | 04.05.2018       | с               | по         |
|                 |                  | 05.04.2018      | 04.05.2018 |

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № пп      | Обоснование   | Наименование   | Ед. изм. | Кол.   |       | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |         |      |      |    |      |
|-----------|---|--|----------|--------|-------|--|---------|------|------|----|------|
|           |   |  |          | на ед. | всего |  |         |      |      |    |      |
| 1         | 2   | 3  | 4        | 5      | 6     | 7  |         |      |      |    |      |
| Раздел 1. |   |  |          |        |       |  |         |      |      |    |      |
| 1         | ГЭСНр58-2-1<br>Приказ Минстроя<br>России №1038/лр<br>от 30.12.2016      | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных           | 100 шт   |        |       | 573  | 573     |      |      |    |      |
|           | 1. 91.06.03-060   | Затраты труда рабочих (ср 2,2)                             | чел. час | 341,3  | 3,41  | 167,79   | 572,16  |      |      |    |      |
|           |   | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш. час | 6,1    | 0,06  | 8,01   | 0,48    |      | 0,48 |    |      |
| 2         | ГЭСН10-01-003-01<br>Приказ Минстроя<br>России №1038/лр<br>от 30.12.2016 | Устройство слуховых окон                                   | шт       |        | 3     | 2836,45  | 8509    | 3594 | 520  | 90 | 4395 |
|           |   | Затраты труда рабочих (ср 3)                               | чел. час | 6,63   | 19,89 | 180,7  | 3594,12 |      |      |    |      |
|           |   | Затраты труда машинистов                                   | чел. час | 0,22   | 0,66  |  |         |      |      |    |      |

| 1                  | 2  | 3   | 4        | 5      | 6       | 7       | 8        | 9 | 10     | 11   | 12       |
|--------------------|--|---|----------|--------|---------|---------|----------|---|--------|------|----------|
| 1. 91.05.05-014    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т   | маш. час  | 0,11     | 0,33   | 998,31  | 329,44  |          |   | 329,44 | 90,2 |          |
| 2. 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш. час  | 0,11     | 0,33   | 577,37  | 190,53  |          |   | 190,53 |      |          |
| 3. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные  | т   | 0,0014   | 0,0042 | 56181,6 | 235,96  |          |   |        |      | 235,96   |
| 4. 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта | м3  | 0,06     | 0,18   | 3898,31 | 701,7   |          |   |        |      | 701,7    |
| 5. 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта                   | м3  | 0,1      | 0,3    | 7203,39 | 2161,02 |          |   |        |      | 2161,02  |
| 6. 11.1.03.06-0099 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта                        | м3  | 0,06     | 0,18   | 7203,39 | 1296,61 |          |   |        |      | 1296,61  |
| 3                  | 11.2.07.02-0021  | Окна одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой                                 | м2       |        | 2438    | 3657    |          |   |        |      | 3657     |
| 4                  | ГЭСН46-04-008-04<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр  | Разборка покрытый кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов   | 100 м2   |        |         |         |          |   |        |      |          |
|                    | 1. 91.06.03-055  | Затраты труда рабочих (ср 2)  | чел. час | 15,9   | 108,93  | 164,76  | 17947,31 |   |        |      |          |
|                    |  | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)                             | маш. час | 4,6    | 31,51   | 24,12   | 760,02   |   | 760,02 |      |          |
| Д                  | 2. 01.7.07.07  | Строительный мусор  | т        | 1,4    | 9,591   |         |          |   |        |      |          |
| 5                  | ГЭСНр58-1-1<br>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016   | Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2   |        |         |         |          |   |        |      |          |
|                    | 1. 91.05.01-017  | Затраты труда рабочих (ср 2,2)  | чел. час | 15,16  | 84,99   | 167,79  | 14260,47 |   |        |      |          |
|                    |  | Затраты труда машинистов  | чел. час | 0,46   | 2,58    |         |          |   |        |      |          |
|                    | 1. 91.05.01-017  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т  | маш. час | 0,46   | 2,58    | 979,6   | 2527,37  |   |        |      |          |
| 6                  | ГЭСНр58-18-5<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр  | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм                     | 100 м2   |        |         |         |          |   |        |      |          |
|                    |  | Затраты труда рабочих (ср 2,2)  | чел. час | 138,49 | 120,87  | 167,79  | 20280,78 |   |        |      |          |
|                    |  | Затраты труда машинистов  | чел. час | 1,12   | 0,98    |         |          |   |        |      |          |
|                    | 1. 91.06.03-060  | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)                        | маш. час | 1,56   | 1,36    | 8,01    | 10,89    |   | 10,89  |      |          |
|                    | 2. 91.14.02-001  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                     | маш. час | 1,12   | 0,98    | 577,37  | 565,82   |   |        |      |          |
|                    | 3. 01.7.15.06-0111   | Гвозди строительные   | т        | 0,001  | 0,0009  | 56181,6 | 50,56    |   |        |      | 50,56    |
|                    | 4. 11.1.03.05  | Доски необрезные  | м3       | 5,2    | 4,539   | 5677,97 | 25772,31 |   |        |      | 25772,31 |

| 1  | 2  | 3  | 4       | 5      | 6 | 7      | 8         | 9         | 10    | 11      | 12      |           |
|----|--|--|---------|--------|---|--------|-----------|-----------|-------|---------|---------|-----------|
| 7  | <b>ГЭСНр58-5-4</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1038/пр   | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:<br>смена стропильных ног из досок  | 100 м   |        |   | 0,85   | 31765,73  | 27001     | 20467 | 97      |         | 12        |
|    |  | Затраты труда рабочих (ср 3)   | чел.час | 133,25 |   | 113,26 | 180,7     | 20466,08  |       |         |         |           |
|    |  | Затраты труда машинистов   | чел.час | 0,19   |   | 0,16   |           |           |       |         |         |           |
|    | 1. 91.06.03-060  | Лебедки электрические тяговые усилием: до 5,79 кН<br>(0,59 т)  | маш.час | 0,52   |   | 0,44   | 8,01      | 3,52      |       | 3,52    |         |           |
|    | 2. 91.14.02-001  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш.час | 0,19   |   | 0,16   | 577,37    | 92,38     |       | 92,38   |         |           |
|    | 3. 01.7.15.06-0111   | Гвозди строительные  | т       | 0,013  |   | 0,0111 | 56181,6   | 623,62    |       |         |         | 623,62    |
|    | 4. 11.1.03.06-0094   | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м,<br>шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II<br>сорта  | м3      | 0,95   |   | 0,8075 | 7203,39   | 5816,74   |       |         |         | 5816,74   |
| 8  | <b>ГЭСН26-02-018-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России №1038/пр<br>от 30.12.2016 | Огнебиозащитное покрытие деревянных<br>поверхностей готовыми составами для обеспечения<br>второй группы огнезащитной эффективности по НПБ<br>251 | 100 м2  |        |   | 8,9696 | 335,32    | 3008      | 2885  | 123     |         |           |
|    |  | Затраты труда рабочих (ср 3)   | чел.час | 1,78   |   | 15,97  | 180,7     | 2885,78   |       |         |         |           |
|    | 1. 91.21.01-012  | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски<br>поверхностей конструкций, мощность 1 кВт  | маш.час | 0,86   |   | 7,71   | 15,79     | 121,74    |       | 121,74  |         |           |
| 9  | <b>3-17/3051</b>   | Гранит огнебиозащита   | т       |        |   | 0,1659 | 109252,63 | 18125     |       |         |         | 18125     |
| 10 | <b>ГЭСН12-01-014-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России №1038/пр<br>от 30.12.2016 | Утепление покрытий: вермикулитом   | м3      |        |   | 24,15  | 5410,56   | 130665    | 12096 | 8046    | 1759    | 110523    |
|    |  | Затраты труда рабочих (ср 2)   | чел.час | 3,04   |   | 73,42  | 164,76    | 12096,68  |       |         |         |           |
|    |  | Затраты труда машинистов   | чел.час | 0,34   |   | 8,21   |           |           |       |         |         |           |
|    | 1. 91.05.01-017  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т   | маш.час | 0,12   |   | 2,9    | 979,6     | 2840,84   |       | 2840,84 | 678,17  |           |
|    | 2. 91.06.05-011  | Погрузчик, грузоподъемность 5 т  | маш.час | 0,22   |   | 5,31   | 980,11    | 5204,38   |       | 5204,38 | 1080,48 |           |
| 3  | 3. 12.2.03.04-0001   | Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67)  | м3      | 1,03   |   | 24,87  | 4443,22   | 110502,88 |       |         |         | 110502,88 |
| 11 | <b>ГЭСНр69-7-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России №1038/пр<br>от 30.12.2016      | Устройство: ходов на чердаке   | 100 м   |        |   | 0,404  | 18270,62  | 7381      | 1423  | 40      | 12      | 5918      |
|    |  | Затраты труда рабочих (ср 2,3)   | чел.час | 20,8   |   | 8,4    | 169,31    | 1422,2    |       |         |         |           |
|    |  | Затраты труда машинистов   | чел.час | 0,27   |   | 0,11   |           |           |       |         |         |           |
|    | 1. 91.06.06-048  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до<br>500 кг, высота подъема 45 м  | маш.час | 0,17   |   | 0,07   | 248,6     | 17,4      |       | 17,4    | 12,65   |           |
|    | 2. 91.14.02-001  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш.час | 0,1    |   | 0,04   | 577,37    | 23,09     |       | 23,09   |         |           |
|    | 3. 01.7.15.06-0111   | Гвозди строительные  | т       | 0,006  |   | 0,0024 | 56181,6   | 134,84    |       |         |         | 134,84    |

| 1                   | 2   | 3        | 4       | 5       | 6        | 7         | 8     | 9 | 10      | 11      | 12        |
|---------------------|---|----------|---------|---------|----------|-----------|-------|---|---------|---------|-----------|
| 4. 11.1.03.01-0080  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта     | М3       | 0,3     | 0,1212  | 7203,39  | 873,05    |       |   |         |         | 12        |
| 5. 11.1.03.05-0015  | Доски необрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта    | М3       | 2,14    | 0,8646  | 5677,97  | 4909,17   |       |   |         |         | 4909,17   |
| 13                  | ГЭСН12-01-007-01<br>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016                                 | 100 м2   |         | 6,8508  | 49331,19 | 337958    | 59907 |   | 9795    | 1886    | 268256    |
|                     | Затраты труда рабочих (ср 3, 1)   | чел. час | 47,91   | 328,22  | 182,52   | 59906,71  |       |   |         |         |           |
|                     | Затраты труда машинистов  | чел. час | 1,69    | 11,58   |          |           |       |   |         |         |           |
| 1. 91.05.01-017     | Краны башенные, грузоподъемность 8 т  | маш. час | 0,71    | 4,86    | 979,6    | 4760,86   |       |   | 4760,86 | 1136,51 |           |
| 2. 91.05.05-014     | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т  | маш. час | 0,4     | 2,74    | 998,31   | 2735,37   |       |   | 2735,37 | 748,92  |           |
| 3. 91.14.02-001     | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т   | маш. час | 0,58    | 3,97    | 577,37   | 2292,16   |       |   | 2292,16 |         |           |
| 4. 01.1.01.03       | Шаблоны коньковые   | шт       | 20      | 137     | 239,32   | 32786,84  |       |   |         |         | 32786,84  |
| 5. 01.1.01.04-0002  | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм                           | м2       | 135     | 924,9   | 153,83   | 142277,37 |       |   |         |         | 142277,37 |
| 6. 01.7.07.14       | Прокладки толевые   | шт       | 500     | 3425    | 1,73     | 5925,25   |       |   |         |         | 5925,25   |
| 7. 01.7.15.06-0094  | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм                           | т        | 0,008   | 0,0548  | 103723,8 | 5684,06   |       |   |         |         | 5684,06   |
| 8. 01.7.15.06-0111  | Гвозди строительные   | т        | 0,00567 | 0,0388  | 56181,6  | 2179,85   |       |   |         |         | 2179,85   |
| 9. 01.7.15.06-0146  | Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм   | т        | 0,00189 | 0,0129  | 69135,6  | 891,85    |       |   |         |         | 891,85    |
| 10. 04.3.01.09      | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный   | м3       | 0,08    | 0,5481  | 3008,47  | 1648,94   |       |   |         |         | 1648,94   |
| 11. 08.1.02.11-0001 | Покówki из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг  | т        | 0,005   | 0,0343  | 49830,88 | 1709,2    |       |   |         |         | 1709,2    |
| 12. 08.1.02.11-0013 | Покówki оцинкованные, масса: 2,825 кг   | т        | 0,01    | 0,0685  | 66371,83 | 4546,47   |       |   |         |         | 4546,47   |
| 13. 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм  | т        | 0,054   | 0,3699  | 52118,64 | 19278,68  |       |   |         |         | 19278,68  |
| 14. 11.1.03.01-0078 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта     | м3       | 0,54    | 3,699   | 7203,39  | 26645,34  |       |   |         |         | 26645,34  |
| 15. 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3       | 0,5     | 3,425   | 7203,39  | 24671,61  |       |   |         |         | 24671,61  |
| 14                  | ГЭСНр58-12-3<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр                                     | 100 м2   |         | -1,2448 | 10943,97 | -13623    | -3927 |   | -131    | -43     | -9565     |
|                     | Затраты труда рабочих (ср 2, 2)   | чел. час | 18,8    | -23,4   | 167,79   | -3926,29  |       |   |         |         |           |
|                     | Затраты труда машинистов  | чел. час | 0,29    | -0,36   |          |           |       |   |         |         |           |

| 1  | 2  | 3  | 4       | 5       | 6       | 7        | 8        | 9    | 10     | 11   | 12              |
|----|--|--|---------|---------|---------|----------|----------|------|--------|------|-----------------|
| 1  | 1. 91.06.06-048  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                           | маш.час | 0,19    | -0,24   | 248,6    | -59,66   |      | -59,66 |      | 12              |
|    | 2. 91.14.02-001  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш.час | 0,1     | -0,12   | 577,37   | -69,28   |      | -69,28 |      |                 |
|    | 3. 01.7.15.06-0111   | Гвозди строительные  | т       | 0,006   | -0,0075 | 56181,6  | -421,36  |      |        |      | -421,36         |
| 3  | 4. 11.1.03.01-0078   | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта      | м3      | 0,54    | -0,6722 | 7203,39  | -4842,12 |      |        |      | -4842,12        |
| 3  | 5. 11.1.03.06-0094   | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта. | м3      | 0,48    | -0,5975 | 7203,39  | -4304,03 |      |        |      | -4304,03        |
| 15 | <b>ГЭСНр58-18-5</b><br>Приказ Минстроя<br>России №1038/пр<br>от 30.12.2016     | Смена коньковой доски толщиной: до 50 мм   | 100 м2  |         | 0,2865  | 53478,01 | 15321    | 6657 | 189    |      | 8475            |
|    |  | Затраты труда рабочих (ср 2,2)   | чел.час | 138,49  | 39,68   | 167,79   | 6657,91  |      |        |      |                 |
|    |  | Затраты труда машинистов   | чел.час | 1,12    | 0,32    |          |          |      |        |      |                 |
|    | 1. 91.06.03-060  | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)   | маш.час | 1,56    | 0,45    | 8,01     | 3,6      |      | 3,6    |      |                 |
|    | 2. 91.14.02-001  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш.час | 1,12    | 0,32    | 577,37   | 184,76   |      | 184,76 |      |                 |
|    | 3. 01.7.15.06-0111   | Гвозди строительные  | т       | 0,001   | 0,0003  | 56181,6  | 16,85    |      |        |      | 16,85           |
|    | 4. 11.1.03.05  | Доски необрезные   | м3      | 5,2     | 1,49    | 5677,97  | 8460,18  |      |        |      |                 |
| 16 | <b>ГЭСН10-01-044-12</b><br>Приказ Минстроя<br>России №1038/пр<br>от 30.12.2016 | Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (прим)              | 100 м2  |         | 0,1344  | 51810,37 | 6963     | 1850 | 18     | 3    | 8460,18<br>5095 |
|    |  | Затраты труда рабочих (ср 2,5)   | чел.час | 79,79   | 10,72   | 172,5    | 1849,2   |      |        |      |                 |
|    |  | Затраты труда машинистов   | чел.час | 0,18    | 0,02    |          |          |      |        |      |                 |
|    | 1. 91.05.05-014  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т   | маш.час | 0,07    | 0,01    | 998,31   | 9,98     |      | 9,98   | 2,73 |                 |
|    | 2. 91.14.02-001  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш.час | 0,11    | 0,01    | 577,37   | 5,77     |      | 5,77   |      |                 |
|    | 3. 01.7.15.06-0146   | Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм  | т       | 0,0012  | 0,0002  | 69135,6  | 13,83    |      |        |      | 13,83           |
|    | 4. 08.3.05.05-0051   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм   | т       | 0,72    | 0,0968  | 52542    | 5086,07  |      |        |      | 5086,07         |
| 17 | <b>ГЭСН10-01-052-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России №1038/пр<br>от 30.12.2016 | Устройство: лестниц без подшивки (прим.)   | м2      |         | 4,8     | 1094,99  | 5256     | 3985 | 166    |      | 1105            |
|    |  | Затраты труда рабочих (ср 4)   | чел.час | 4,08    | 19,58   | 203,48   | 3984,14  |      |        |      |                 |
|    |  | Затраты труда машинистов   | чел.час | 0,06    | 0,29    |          |          |      |        |      |                 |
|    | 1. 91.14.02-001  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш.час | 0,06    | 0,29    | 577,37   | 167,44   |      | 167,44 |      |                 |
|    | 2. 01.7.15.06-0111   | Гвозди строительные  | т       | 0,00025 | 0,0012  | 56181,6  | 67,42    |      |        |      | 67,42           |

| 1  | 2   | 3   | 4        | 5       | 6      | 7        | 8       | 9    | 10    | 11    | 12      |
|----|---|---|----------|---------|--------|----------|---------|------|-------|-------|---------|
|    | 3. 11.1.03.01-0078  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3       | 0,03    | 0,144  | 7203,39  | 1037,29 |      |       |       | 1037,29 |
| 18 | ГЭСН10-01-083-03<br>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016 | Устройство трапов и лестниц со слуховых окон и до конька (прим.)                              | 100 м2   |         | 0,0945 | 33996,01 | 3213    | 516  | 77    | 15    | 2620    |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 3,3)  | чел. час | 29,21   | 2,76   | 187,08   | 516,34  |      |       |       |         |
|    |   | Затраты труда машинистов  | чел. час | 0,98    | 0,09   |          |         |      |       |       |         |
|    | 1. 91.05.05-014   | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т  | маш. час | 0,59    | 0,06   | 998,31   | 59,9    |      | 59,9  | 16,4  |         |
|    | 2. 91.14.02-001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т   | маш. час | 0,39    | 0,04   | 577,37   | 23,09   |      | 23,09 |       |         |
|    | 3. 01.7.15.06-0111  | Гвозди строительные   | т        | 0,00875 | 0,0008 | 56181,6  | 44,95   |      |       |       | 44,95   |
|    | 4. 11.1.03.06-0087  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта    | м3       | 2,63    | 0,2485 | 7203,39  | 1790,04 |      |       |       | 1790,04 |
|    | 5. 14.5.06.03-0002  | Паста антисептическая   | т        | 0,072   | 0,0068 | 115010   | 782,07  |      |       |       | 782,07  |
| 19 | ГЭСНр65-38-1<br>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016     | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубков                                   | шт       |         | 4      | 622,38   | 2490    | 2212 |       |       | 278     |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 2,7)  | чел. час | 3,15    | 12,6   | 175,54   | 2211,8  |      |       |       |         |
|    | 1. 01.7.07.29-0031  | Каболка   | т        | 0,0004  | 0,0016 | 173573,4 | 277,72  |      |       |       | 277,72  |
| 20 | 24.3.02.02-0017<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр  | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром: 110 мм, длиной 1,0 м             | м        |         | 8      | 164,04   | 1312    |      |       |       | 1312    |
| 21 | ГЭСН10-01-039-05<br>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016 | Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  | 100 м2   |         | 0,0088 | 22597,76 | 199     | 134  | 65    | 14    |         |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 2,9)  | чел. час | 85,169  | 0,75   | 178,58   | 133,94  |      |       |       |         |
|    |   | Затраты труда машинистов  | чел. час | 8,071   | 0,07   |          |         |      |       |       |         |
|    | 1. 91.05.01-017   | Краны башенные, грузоподъемность 8 т  | маш. час | 6,783   | 0,06   | 979,6    | 58,78   |      | 58,78 | 14,03 |         |
|    | 2. 91.14.02-001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т   | маш. час | 1,288   | 0,01   | 577,37   | 5,77    |      | 5,77  |       |         |
| 3  | 3. 01.7.15.14-0061  | Шурупы-саморезы 3,5x45 мм   | т        |         |        |          |         |      |       |       |         |
| 22 | ГЭСН10-01-039-05<br>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2   | 100 м2   |         | 0,0088 | 32869,47 | 289     | 191  | 93    | 20    | 5       |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 2,9)  | чел. час | 121,67  | 1,07   | 178,58   | 191,08  |      |       |       |         |

| 1  | 2  | 3   | 4         | 5      | 6       | 7        | 8       | 9     | 10    | 11    | 12      |
|----|--|---|-----------|--------|---------|----------|---------|-------|-------|-------|---------|
|    |  | Затраты труда машинистов  |           |        |         |          |         |       |       |       |         |
|    | 1. 91.05.01-017  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т  | чел.час   | 11,53  | 0,1     |          |         |       |       |       |         |
|    | 2. 91.14.02-001  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т   | маш.час   | 9,69   | 0,09    | 979,6    | 88,16   |       | 88,16 | 21,05 |         |
| 3  | 3. 01.7.15.14-0061   | Шурупы-саморезы 3,5x45 мм   | т         | 1,84   | 0,02    | 577,37   | 11,55   |       | 11,55 |       |         |
|    | 4. 04.3.01.07-0011   | Раствор готовый отделочный тяжелый; известковый 1:2,0   | м3        | 0,0016 |         | 52846,21 |         |       |       |       |         |
|    |  |   |           | 0,167  | 0,0015  | 3008,47  | 4,51    |       |       |       | 4,51    |
| 23 | 11.2.02.05-0001<br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016     | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м2 | м2        |        | 0,88    | 3056,7   | 2690    |       |       |       | 2690    |
| 24 | 01.7.04.11-0001<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр     | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава   | компл.    |        | 1       | 341,42   | 341     |       |       |       | 341     |
| 25 | ФСЦЦпг-01-01-01-041<br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную   | 1 т груза |        | 18,4186 | 907,74   | 16719   | 16719 |       |       |         |
| 26 | ФСЦЦпг-03-02-01-022<br>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстоянии: I класс груза до 22 км  | 1 т груза |        | 18,4186 | 258,92   | 4769    |       | 4769  |       |         |
| 27 | Прайс лист "ТМП"   | Утилизация мусора   | т         |        | 18,4186 | 1400,03  | 25787   |       |       |       | 25787   |
|    |  | Непредвиденные затраты  |           |        |         |          |         |       |       |       |         |
| 28 | ГЭСН12-01-008-01<br>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016    | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  | 100 м2    |        | 1,7     | 7159,96  | 12172   | 4116  | 29    | 14    | 8027    |
|    |  | Затраты труда рабочих (ср 3)  | чел.час   | 13,4   | 22,78   | 180,7    | 4116,35 |       |       |       |         |
|    |  | Затраты труда машинистов  | чел.час   | 0,03   | 0,05    |          |         |       |       |       |         |
| 1. | 91.14.02-001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т   | маш.час   | 0,03   | 0,05    | 577,37   | 28,87   |       | 28,87 | 13,67 |         |
| 2. | 01.7.15.06-0146  | Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм   | т         | 0,0014 | 0,0024  | 69135,6  | 165,93  |       |       |       | 165,93  |
| 3. | 08.1.02.11-0013  | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг   | т         | 0,0112 | 0,019   | 66371,83 | 1261,06 |       |       |       | 1261,06 |
| 4. | 08.3.03.05-0002  | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм  | т         | 0,0039 | 0,0066  | 32966    | 217,58  |       |       |       | 217,58  |
| 5. | 08.3.05.05-0053  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм  | т         | 0,072  | 0,1224  | 52118,64 | 6379,32 |       |       |       | 6379,32 |




| 1  | 2   | 3  | 4        | 5      | 6       | 7        | 8        | 9      | 10     | 11    | 12       |
|--|---|--|----------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 29   | ГЭСН12-01-008-02<br>Приказ Минстроя<br>России №1038/пр<br>от 30.12.2016 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб      | 100 м2   |        | -1,7    | 2803,67  | -4426    | -1505  | -10    | -5    | -2911    |
|  |   | Затраты труда рабочих (ср 3)   | чел. час | 4,9    | -8,33   | 180,7    | -1505,23 |        |        |       |          |
|  |   | Затраты труда машинистов   | чел. час | 0,01   | -0,02   |          |          |        |        |       |          |
|  | 1. 91.14.02-001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш. час | 0,01   | -0,02   | 577,37   | -11,55   |        | -11,55 | -5,47 |          |
|  | 2. 01.7.15.06-0146  | Гвозди толстые круглые: 3,0x40 мм  | т        | 0,0014 | -0,0024 | 69135,6  | -165,93  |        |        |       | -165,93  |
|  | 3. 08.3.05.05-0053  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм   | т        | 0,031  | -0,0527 | 52118,64 | -2746,65 |        |        |       | -2746,65 |
| 32   | 3-17/1378<br>Приказ Минстроя<br>России №1039/пр<br>от 30.12.2016        | Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм                              | шт.      |        | 2       | 270,27   | 541      |        |        |       | 541      |
| 34   | 3-17/1382<br>Приказ Минстроя<br>России №1039/пр<br>от 30.12.2016        | Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка   | шт.      |        | 4       | 239,76   | 959      |        |        |       | 959      |
| 36   | 3-17/1371   | Отмет  | шт       |        |         |          |          |        |        |       |          |
| 38   | 3-17/1370<br>Приказ Минстроя<br>России №1039/пр<br>от 30.12.2016        | Держатель желоба МП, диаметр 150 мм, оцинковка   | шт.      |        | 2       | 204,88   | 410      |        |        |       | 410      |
|  |   |  | шт.      |        | 12      | 89,36    | 1072     |        |        |       | 1072     |
| 39   | ГЭСН08-07-001-02<br>Приказ Минстроя<br>России №1038/пр<br>от 30.12.2016 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2   |        | 0,08    | 11009,47 | 881      | 635    | 3      | 2     | 243      |
|  |   | Затраты труда рабочих (ср 3,1)   | чел. час | 43,5   | 3,48    | 182,52   | 635,17   |        |        |       |          |
|  |   | Затраты труда машинистов   | чел. час | 0,07   | 0,01    |          |          |        |        |       |          |
|  | 1. 91.14.02-001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш. час | 0,07   | 0,01    | 577,37   | 5,77     |        | 5,77   | 2,73  |          |
|  | 2. 01.7.16.02-0003  | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные            | т        | 0,035  | 0,0028  | 65343,07 | 182,96   |        |        |       | 182,96   |
|  | 3. 11.2.13.06-0011  | Щиты: настипла   | м2       | 3,4    | 0,272   | 218,36   | 59,39    |        |        |       | 59,39    |
| 40   | ГЭСНр69-5-1<br>Приказ Минстроя<br>России №1038/пр<br>от 30.12.2016      | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов  | 100 шт   |        | 0,08    | 11513,48 | 921      | 315    | 495    | 65    | 111      |
|  |   | Затраты труда рабочих (ср 3,4)   | чел. час | 20,8   | 1,66    | 189,36   | 314,34   |        |        |       |          |
|  |   | Затраты труда машинистов   | чел. час | 8,32   | 0,67    |          |          |        |        |       |          |
|  | 1. 91.06.06-015   | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м  | маш. час | 2,77   | 0,22    | 2231,75  | 490,99   |        | 490,99 | 64,14 |          |
|  | 2. 04.3.01.12-0111  | Раствор готовый отделочный тяжелый.: цементно-известковый 1:1:6  | м3       | 0,4    | 0,032   | 3482,1   | 111,43   |        |        |       | 111,43   |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах |   |  |          |        |         |          |          |        |        |       |          |
|  |   |  |          |        |         |          | 703302   | 185331 | 28245  | 4435  | 489726   |

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|----|----|----|
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   |   |   | 52997             |   |    |    |    |
| Теплоизоляционные работы   |   |   |   |   |   |   | 27651             |   |    |    |    |
| Кровли   |   |   |   |   |   |   | 671142            |   |    |    |    |
| Прочие ремонтно-строительные работы  |   |   |   |   |   |   | 11277             |   |    |    |    |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)                        |   |   |   |   |   |   | 8115              |   |    |    |    |
| Погрузо-разгрузочные работы  |   |   |   |   |   |   | 16719             |   |    |    |    |
| Перевозка грузов автотранспортом   |   |   |   |   |   |   | 4769              |   |    |    |    |
| Конструкции из кирпича и блоков  |   |   |   |   |   |   | 2508              |   |    |    |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   | 1078124           |   |    |    |    |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |    |    |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   | 489726            |   |    |    |    |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   | 40030             |   |    |    |    |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   | 249607            |   |    |    |    |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   | 195130            |   |    |    |    |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   | 109176            |   |    |    |    |
| тендерный коэффициент 1 078 124 * 0,99   |   |   |   |   |   |   | 1067342,76        |   |    |    |    |
| НДС 18%  |   |   |   |   |   |   | 192121,7          |   |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по акту</b>   |   |   |   |   |   |   | <b>1259464,46</b> |   |    |    |    |

Сдал: Генеральный директор ООО "КапиталСтрой" В.В.Шестопалов

Принял: *главный инженер* Тюдов А.Б.

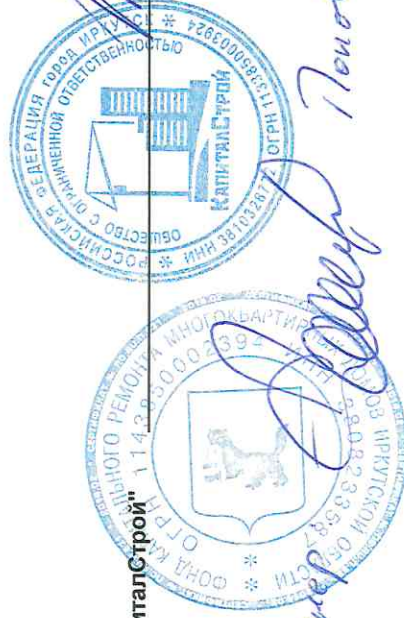

Согласовано :  
Главный инженер аппарата управления \_\_\_\_\_ А.О.Полов

Начальник отдела мониторинга технического состояния и  
технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов \_\_\_\_\_ О.В.Асташкина

Начальник отдела подготовки ПСД \_\_\_\_\_  
Е.В.Лебедева

Специалист отдела мониторинга технического состояния и  
технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов \_\_\_\_\_ Ю.А.Батурин

Заместитель главы администрации - председатель комитета  
по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское \_\_\_\_\_ Д.Г.Тютрин

Представитель строительного контроля \_\_\_\_\_ В.И.Тютюн

Субподрядчик: Директор ООО "Востоктяжстрой Усолье" \_\_\_\_\_ В.Н.Саловаров

*Специалист отп. мониторинга*

