

Инвестор -**Заказчик** Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул.5-й Армии, д.2/1**Подрядчик** - ООО "Востоктяжстрой Усолье", 665462, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, д.75**Стройка** -Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
г Усолье-Сибирское, ул. Стопани, №69

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
по ОКПО	
по ОКПО	71799113
по ОКПО	
номер	13/ПО-А/2017-2018
дата	16 02 2018
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер	Дата составления	Отчетный период	
5	01.06.2018	с	по
		01.03.2018	01.06.2018

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительн	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 624 211,00	2 624 211,00	2 624 211,00
1	Ремонт крыши		2 624 211,00	2 624 211,00	2 624 211,00
Итого, руб.					2 624 211,00
Налог на добавленную стоимость, руб.					472 357,98
Всего с учетом налогов, руб.					3 096 568,98

Заказчик И.О. Генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

м.п.



Согласован главный бухгалтер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области



(подпись)

К.Г.Сорокиков

(расшифровка подписи)

(подпись)

В.Н.Саловаров

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.Г. Боброва

(расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,11	0,33	577,37	190,53		190,53		12
	3. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0014	0,0042	56181,6	235,96				235,96
	4. 11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	0,06	0,18	3898,31	701,7				701,7
	5. 11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,1	0,3	7203,39	2161,02				2161,02
	6. 11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,06	0,18	7203,39	1296,61				1296,61
3	11.2.07.02-0021	Окна одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой	м2	2,88	2,88	2438	7021				7021
4	ГЭСНр58-4-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Разборка парпетных решеток	100 м		1,7	2468,55	4197	4184	13		
	1. 91.06.03-060	Затраты труда рабочих (ср 2, 1)	чел.час	14,8	25,16	166,28	4183,6				
		Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,95	1,62	8,01	12,98		12,98		
5	ГЭСН46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		11,6	2730,63	31675	30388	1287		
	1. 91.06.03-055	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	15,9	184,44	164,76	30388,33				
		Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.час	4,6	53,36	24,12	1287,04		1287,04		
Д	2. 01.7.07.07	Строительный мусор	т	1,4	16,24						
6	ГЭСНр58-1-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		11,6	2994,32	34734	29507	5227	1248	
	1. 91.05.01-017	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	15,16	175,86	167,79	29507,55				
		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	чел.час	0,46	5,34						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,46	5,34	979,6	5231,06		5231,06	1248,76	
7	ГЭСНр58-5-4 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из досок	100 м		0,5195	32161,32	16708	12509	59		4140
	1. 91.06.03-060	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	133,25	69,22	180,7	12508,05				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,19	0,1						
		Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,52	0,27	8,01	2,16		2,16		
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,19	0,13	577,37	57,74		57,74		
	3. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,013	0,0068	56181,6	382,03				382,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. 08.3.03.06	Проволока	т	0,012	0,0062	32966	204,39				204,39
	5. 11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,95	0,4935	7203,39	3554,87				3554,87
8	ГЭСН10-01-008-05 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Разборка : карнизов	100 м2		0,88	18451,81	16238	15918	320		
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	100,1	88,09	180,7	15917,86				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,63	0,55						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,63	0,55	577,37	317,55		317,55		
9	ГЭСН10-01-008-05 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство: карнизов	100 м2		0,2613	45002,66	11759	6752	136		4871
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	143	37,37	180,7	6752,76				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,9	0,24						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,9	0,24	577,37	138,57		138,57		
	2. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0036	0,0009	56181,6	50,56				50,56
	3. 11.1.01.12-0007	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1,06	0,277	7203,39	1995,34				1995,34
	4. 11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,92	0,2404	7203,39	1731,7				1731,7
	5. 11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0,58	0,1516	7203,39	1092,03				1092,03
10	ГЭСН10-01-002-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Демонтаж стропил (кобылки) прим	м3		2,08	3604,42	7497	7037	460	68	
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	19,272	40,09	175,54	7037,4				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,296	0,62						
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш. час	0,12	0,25	998,31	249,58		249,58	68,33	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,176	0,37	577,37	213,63		213,63		
11	ГЭСН10-01-002-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Установка стропил (кобылка) прим.	м3		2,08	14239,77	29619	8796	576	85	20247
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	24,09	50,11	175,54	8796,31				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,37	0,77						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,15	0,31	998,31	309,48		309,48	84,73	
	2.91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,22	0,46	577,37	265,59		265,59		
	3.01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0072	0,015	56181,6	842,72				842,72
	4.08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,038	0,079	34616,42	2734,7				2734,7
	5.08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00438	0,0091	32966	299,99				299,99
	6.11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,16	0,3328	7203,39	2397,29				2397,29
	7.11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,06	0,1248	7203,39	898,98				898,98
	8.11.1.03.06-0093	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	0,83	1,726	7203,39	12433,05				12433,05
	9.12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3,38	7,03	23,95	168,37				168,37
	10.14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0041	115010	471,54				471,54
12	ГЭСНр58-5-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		1,34	25429,75	34076	9654	278	128	24144
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	39,87	53,43	180,7	9654,8				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	0,47						
	1.91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,64	0,86	8,01	6,89		6,89		
	2.91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,35	0,47	577,37	271,36		271,36	128,47	
	3.01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,038	0,0509	68114,82	3467,04				3467,04
	4.11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2,1	2,814	7347,46	20675,75				20675,75
13	ГЭСН26-02-018-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		17,4	335,32	5835	5597	238		
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	1,78	30,97	180,7	5596,28				
	1.91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,86	14,96	15,79	236,22		236,22		
14	3-17/3051	Гранит огнебиозащита	т		0,3219	106950	34427				34427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ГЭСН12-01-014-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Утепление покрытий: вермикулитом	м3		48	5410,56	259707	24042	15992	3496	219673
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	3,04	145,92	164,76	24041,78				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,34	16,32						
	1. 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш. час	0,12	5,76	979,6	5642,5		5642,5	1346,98	
	2. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш. час	0,22	10,56	980,11	10349,96		10349,96	2148,75	
	3. 02.2.01.03	Вермикулит	м3	1,03	49,44	4443,22	219672,8				219672,8
16	ГЭСНр69-7-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство: ходов на чердаке	100 м		0,75	18270,62	13703	2641	75	23	10987
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел. час	20,8	15,6	169,31	2641,24				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,27	0,2						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. час	0,17	0,13	248,6	32,32		32,32	23,49	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,1	0,08	577,37	46,19		46,19		
	3. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,006	0,0045	56181,6	252,82				252,82
	4. 11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,3	0,225	7203,39	1620,76				1620,76
	5. 11.1.03.05-0015	Доски необрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м3	2,14	1,605	5677,97	9113,14				9113,14
17	ГЭСН12-01-007-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2		10,53	49255,12	518656	92080	15055	4569	411521
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	47,91	504,49	182,52	92079,51				
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,69	17,8						
	1. 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш. час	0,71	7,48	979,6	7327,41		7327,41	1749,2	
	2. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш. час	0,4	4,21	998,31	4202,89		4202,89	1150,72	
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,58	6,11	577,37	3527,73		3527,73	1670,05	
	4. 01.1.01.03	Шаблоны коньковые	шт.	20	210,6	239,32	50400,79				50400,79
	5. 01.1.01.04-0002	Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м2	135	1422	153,83	218746,26				218746,26
	6. 01.7.07.14	Прокладки толевые	шт.	500	5265	1,73	9108,45				9108,45
	7. 01.7.15.06-0094	Гвозди провололочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм	т	0,008	0,0842	103723,8	8733,54				8733,54
	8. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00567	0,0597	56181,6	3354,04				3354,04
	9. 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм	т	0,00189	0,0199	69135,6	1375,8				1375,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.04.3.01.09	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.04.3.01.09	10.04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,08	0,8424	3008,47	2534,34				2534,34
11.08.1.02.11-0001	11.08.1.02.11-0001	Покówki из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,005	0,0527	34616,42	1824,29				1824,29
12.08.1.02.11-0013	12.08.1.02.11-0013	Покówki оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0,01	0,1053	66371,83	6988,95				6988,95
13.08.3.05.05-0053	13.08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,054	0,5686	52118,64	29634,66				29634,66
14.11.1.03.01-0078	14.11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,54	5,686	7203,39	40958,48				40958,48
15.11.1.03.06-0094	15.11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,5	5,265	7203,39	37925,85				37925,85
18	ГЭСН12-01-009-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство желобов: настенных	100 м		1,782	120488,24	214710	27290	4820	933	182600
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	84,75	151,02	180,7	27289,31				
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,19	5,68						
1.91.05.01-017	1.91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	1,34	2,39	979,6	2341,24		2341,24	558,9	
2.91.05.05-014	2.91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,77	1,37	998,31	1367,68		1367,68	374,46	
3.91.14.02-001	3.91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	1,08	1,92	577,37	1108,55		1108,55		
4.01.7.15.06-0094	4.01.7.15.06-0094	Гвозди провололочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм	т	0,0114	0,0203	103723,8	2105,59				2105,59
5.01.7.15.06-0146	5.01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм	т	0,0025	0,0045	69135,6	311,11				311,11
6.08.1.02.11-0013	6.08.1.02.11-0013	Покówki оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0,1	0,1782	66371,83	11827,46				11827,46
7.08.3.05.05-0053	7.08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	1,11	1,978	52118,64	103090,67				103090,67
8.11.1.03.06-0079	8.11.1.03.06-0079	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	4,45	7,93	7203,39	57122,88				57122,88
9.12.1.02.14-0002	9.12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	20,1	35,82	23,95	857,89				857,89
10.14.2.04.01-0001	10.14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,067	0,1194	61020	7285,79				7285,79
19	ГЭСН10-01-044-12 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (прим)	100 м2		0,09	51810,37	4663	1239	12	2	3412
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	79,79	7,18	172,5	1238,55				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,18	0,02						
1.91.05.05-014	1.91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,07	0,01	988,31	9,98		9,98	2,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,11	0,01	577,37	5,77		5,77		12
	3. 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм	т	0,0012	0,0001	69135,6	6,91				6,91
	4. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0,72	0,0648	52542	3404,72				3404,72
20	ГЭСН10-01-052-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство: лестниц без подшивки (прим.)	м2		2,7	1094,99	2956	2242	94		620
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	4,08	11,02	203,48	2242,35				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,06	0,16						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,06	0,16	577,37	92,38		92,38		
	2. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00025	0,0007	56181,6	39,33				39,33
	3. 11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,03	0,081	7203,39	583,47				583,47
21	ГЭСН10-01-083-03 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство трапов и лестниц со слуховых окон и до конька (прим.)	100 м2		0,126	33996,01	4283	689	103	20	3491
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	29,21	3,68	187,08	688,45				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,98	0,12						
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,59	0,07	998,31	69,88		69,88	19,13	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,39	0,05	577,37	28,87		28,87		61,8
	3. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00875	0,0011	56181,6	61,8				
	4. 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2,63	0,3314	7203,39	2387,2				2387,2
	5. 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,072	0,0091	115010	1046,59				1046,59
22	ГЭСН10-01-023-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Укладка ходовых досок (прим.)	100 м		0,62	7626,42	4728	417	64	14	4247
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	3,8	2,36	177,06	417,86				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,12	0,07						
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,08	0,05	998,31	49,92		49,92	13,67	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,02	577,37	11,55		11,55		
	3. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00066	0,0004	56181,6	22,47				22,47
	4. 11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	1,2	0,744	5677,97	4224,41				4224,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ГЭСН10-01-014-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Разборка чистых перегородок: дощатых однослойных	100 м2		0,42	16447,37	6908	6515	393	78	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	90,797	38,13	170,83	6513,75				
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,127	0,47						
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш. час	0,679	0,29	998,31	289,51		289,51	79,27	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,448	0,19	577,37	109,7		109,7		
24	ГЭСН10-01-014-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных(прим) вентшахты	100 м2		1,2964	58841,75	76282	28726	1734	344	45822
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	129,71	168,16	170,83	28726,77				
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,61	2,09						
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш. час	0,97	1,26	998,31	1257,87		1257,87	344,4	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,64	0,83	577,37	479,22		479,22		608,47
	3. 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0,0042	0,0054	112679,4	608,47				
	4. 11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,19	0,2463	7203,39	1774,2				1774,2
	5. 11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	4,6	5,963	7203,39	42953,81				42953,81
	6. 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0032	0,0041	115010	471,54				471,54
25	ГЭСН10-01-044-11 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Обивка вентшахт оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (прим)	100 м2		1,2964	79472,88	103029	29738	249	35	73042
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел. час	132,98	172,4	172,5	29739				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,26	0,34						
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш. час	0,1	0,13	998,31	129,78		129,78	35,53	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,16	0,21	577,37	121,25		121,25		159,01
	3. 01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые: 3,0х40 мм	т	0,00176	0,0023	69135,6	159,01				
	4. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	1,07	1,387	52542	72875,75				72875,75
26	ГЭСНр69-8-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Утепление вентиляционных шахт: минеральной ватой	100 м3		0,06482	403922,59	26182	4563	47		21572
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	427,28	27,7	164,76	4563,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,26	0,08						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	1,26	0,08	577,37	46,19		46,19		
3	2. 12.2.05.05-0006	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96)	м3	105	6,806	3169,49	21571,55				21571,55
27	ГЭСНр58-21-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт		0,8	6956,3	5565	2567	14		2984
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел. час	18,6	14,88	172,5	2566,8				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,03	0,02						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,03	0,02	577,37	11,55		11,55		
3	2. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0,071	0,0568	52542	2984,39				2984,39
28	ГЭСНр65-38-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубками	шт		12	622,38	7469	6635			834
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	3,15	37,8	175,54	6635,41				
	1. 01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,0004	0,0048	173573,4	833,15				833,15
29	24.3.02.02-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром: 110 мм, длиной 1,0 м	м		30	164,04	4921				4921
30	3-17/4713	Переход чугуна-пластик	шт		12	121,01	1452				1452
31	ГЭСН12-01-008-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2		26,25	7159,96	187949	63561	455	215	123933
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	13,4	351,75	180,7	63561,23				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,03	0,79						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,03	0,79	577,37	456,12		456,12	215,93	
	2. 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм	т	0,0014	0,0368	69135,6	2544,19				2544,19
	3. 08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0,0112	0,294	66371,83	19513,32				19513,32
	4. 08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,0039	0,1024	32966	3375,72				3375,72
	5. 08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,072	1,89	52118,64	98504,23				98504,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ГЭСН12-01-008-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2		-26,25	2603,67	-68346	-23243	-151	-72	-44952
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	4,9	-128,63	180,7	-23243,44				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,01	-0,26						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,01	-0,26	577,37	-150,12		-150,12	-71,07	-2544,19
	2. 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм	т	0,0014	-0,0368	69135,6	-2544,19				
	3. 08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,031	-0,8138	52118,64	-42414,15				-42414,15
33	3-17/1382 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.		24	239,76	5754				5754
34	3-17/1378 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.		12	270,27	3243				3243
35	3-17/1371	Отмет	шт		12	204,88	2459				2459
36	ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Ограждение кровель перилами	100 м		1,75	25963,65	45436	2184	744	126	42508
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	6,67	11,67	187,08	2183,22				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,43	0,75						
	1. 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш. час	0,18	0,32	979,6	313,47		313,47	74,83	
	2. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш. час	0,11	0,19	998,31	189,68		189,68	51,93	
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,14	0,25	577,37	144,34		144,34		
	4. 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	1,89	3,31	30,8	101,95		101,95		
	5. 01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,0005	0,0009	87658,8	78,89				78,89
	6. 01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0,52	0,91	181,31	164,99				164,99
3	7. 07.2.07.13-0071	Конструкции стальные перил	т	0,3	0,525	80508,47	42266,95				42266,95
37	ГЭСН46-04-001-04 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Разборка: кирпичных стен	м3		10,5	2065,77	21691	16187	5504		
		Затраты труда рабочих (ср 3.3)	чел. час	8,24	86,52	187,08	16186,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час	1,15	12,08	231,55	2797,12		2797,12		
	2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	2,3	24,15	112,15	2708,42		2708,42		
39	ГЭСН10-01-039-05 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2		0,014	22597,76	316	213	103	22	
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	85,169	1,19	178,58	212,51				
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,071	0,11						
	1. 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	6,783	0,09	979,6	88,16		88,16	21,05	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	1,288	0,02	577,37	11,55		11,55		
3	3. 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм	т								
40	ГЭСН10-01-039-05 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2		0,014	32784,92	459	304	148	32	7
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	121,67	1,7	178,58	303,59				
		Затраты труда машинистов	чел.час	11,53	0,16						
	1. 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69	0,14	979,6	137,14		137,14	32,74	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	1,84	0,03	577,37	17,32		17,32		
3	3. 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм	т	0,0016							
	4. 04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый; известковый 1:2,0	м3	0,167	0,0023	3008,47	6,92				6,92
41	08.1.02.06-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Люки лазы со щитовыми полотнами утепленные минералватной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок	м2		1,4	3056,7	4279				4279
42	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		34,3582	907,74	31188	31188			
43	ФССЦпг-03-02-01-022 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 22 км	1 т груза		34,3582	258,92	8896		8896		
44	Прайс лист "ТМП"	Утилизация мусора	т		34,3582	1400,03	48103				48103
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							1980452	618438	90257	14321	1271757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	накладные расходы						525006				
	сметная прибыль						271485				
	Итого по акту:						219468				
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						603917				
	Деревянные конструкции						143557				
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						52903				
	Теплоизоляционные работы						1638940				
	Кровли						51293				
	Прочие ремонтно-строительные работы						26781				
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										
	Погрузо-разгрузочные работы						31188				
	Перевозка грузов автотранспортом						8896				
	Итого						2776943				
	В том числе:						1271757				
	Материалы						90257				
	Машины и механизмы						632759				
	ФОТ						525006				
	Накладные расходы						271485				
	Сметная прибыль						2624211				
	С учетом тендерного коэффициента 0,94499999974						472357,98				
	НДС 18%						3096568,98				
	ВСЕГО по акту										




Сдал: Директор ООО "Востоктяжстрой Усолье"

[Handwritten signature] В.Н.Саловаров

Принял: Главный инженер аппарата управления

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

А.О.Попов

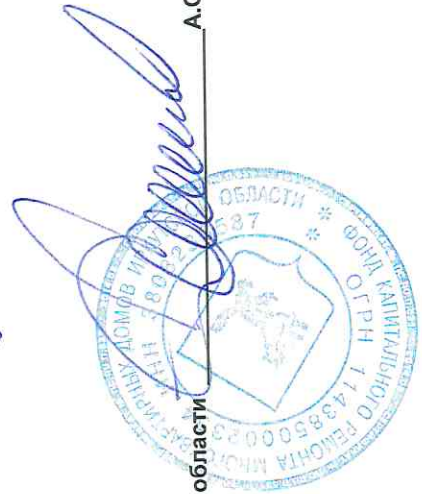

Согласовано :

Начальник отдела мониторинга технического состояния и
технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____ О.В.Асташкина

Де л 3 от 21.06.18

Начальник отдела подготовки ПСД _____
Е.В.Лебедева

Специалист отдела мониторинга технического состояния и
технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____
Ю.А.Батурин

Специалист отдела мониторинга технического состояния и
технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____
Ю.М.Савченко

Уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме _____
И.Н.Торгонская

Заместитель мэра города- председатель комитета
по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _____
А.М.Корнилов



Представитель строительного контроля _____
М.А. Руденко *С.И. Мухоморова* *В.А. Висоцкий*
